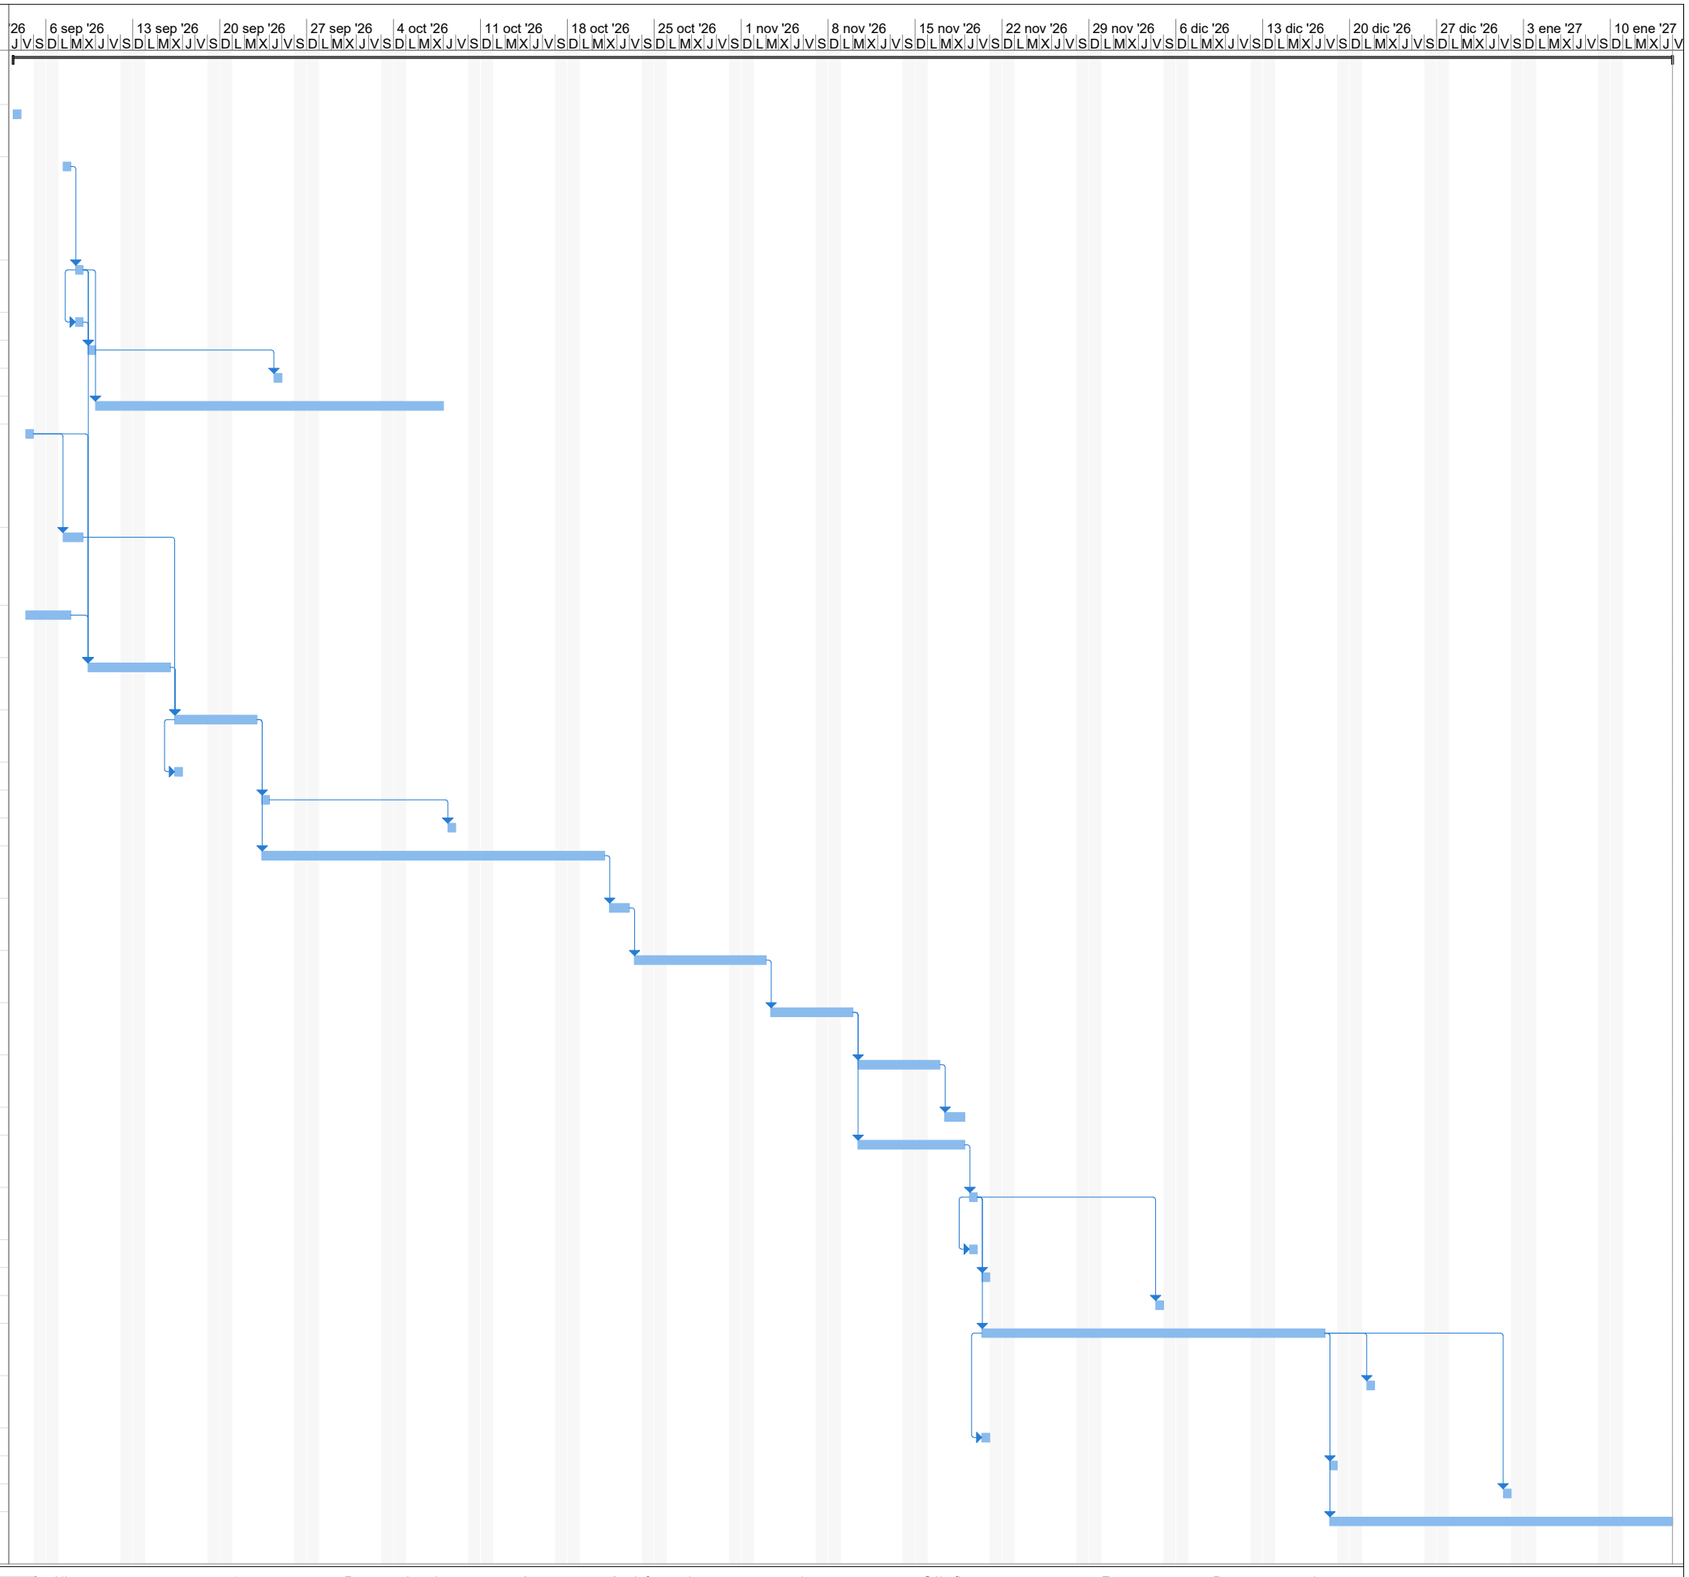
Id		% completa	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**0%**		**Pavimentos Pilar-Bimbo**	**96 días?**	**jue 3/9/26**	**jue 14/1/27**	
2		0%		Entrega de estudios Proctor y densidades	1 día	jue 3/9/26	jue 3/9/26	
3		0%		Colocación de nylon y limpieza pre hormigonado paño 1 (cerca de guardia)	1 día	lun 7/9/26	lun 7/9/26	
4		0%		Hormigonado paño 1(cerca de guardia)	1 día	mar 8/9/26	mar 8/9/26	3
5		0%		Laboratorio	1 día	mar 8/9/26	mar 8/9/26	4CC
6		0%		Aserrado de juntas	1 día	mié 9/9/26	mié 9/9/26	5;4
7		0%		Tomado de juntas	1 día	jue 24/9/26	jue 24/9/26	6FC+10 días
8		0%		Periodo de curado	20 días	mié 9/9/26	mié 7/10/26	4
9		0%		Hormigonado diferencia de nivel en paño de pase de media tensión	1 día	vie 4/9/26	vie 4/9/26	
10		0%		Pasadores en paños para hormigonado etapa 1 parte B	2 días	lun 7/9/26	mar 8/9/26	9
11		0%		Aprobar badenes para etapa 1 parte B	2 días	vie 4/9/26	lun 7/9/26	
12		0%		Ajuste de niveles, armado de badenes	5 días	mié 9/9/26	mar 15/9/26	9;11;4
13		0%		Hormigonado etapa 1 parte B	5 días	mié 16/9/26	mar 22/9/26	10;12
14		0%		Laboratorio	1 día	mié 16/9/26	mié 16/9/26	13CC
15		0%		Aserrado de juntas	1 día	mié 23/9/26	mié 23/9/26	13
16		0%		Tomado de juntas	1 día?	jue 8/10/26	jue 8/10/26	15FC+10 días
17		0%		Periodo de curado Etapa 1 parte b	20 días	mié 23/9/26	mar 20/10/26	13
18		0%		Rotura de pavimento Etapa 2	2 días	mié 21/10/26	jue 22/10/26	17
19		0%		Retiro de escombros y tosca	7 días	vie 23/10/26	lun 2/11/26	18
20		0%		Aporte de tosca -suelo cemento	5 días	mar 3/11/26	lun 9/11/26	19
21		0%		Toma muestras y estudio de suelo	5 días	mar 10/11/26	lun 16/11/26	20
22		0%		Ok Pruebas	2 días	mar 17/11/26	mié 18/11/26	21
23		0%		Colocación de armadura y encofrado	7 días	mar 10/11/26	mié 18/11/26	20
24		0%		Hormigonado Etapa 2 parte A	1 día	jue 19/11/26	jue 19/11/26	23
25		0%		Laboratorio	1 día	jue 19/11/26	jue 19/11/26	24CC
26		0%		Aserrado de juntas	1 día	vie 20/11/26	vie 20/11/26	24
27		0%		Tomado de juntas	1 día	vie 4/12/26	vie 4/12/26	24FC+10 días
28		0%		Periodo de curado Etapa 1 parte A	20 días	vie 20/11/26	jue 17/12/26	24
29		0%		Hormigonado Etapa 2 parte B	1 día	lun 21/12/26	lun 21/12/26	28FC+1 día
30		0%		Laboratorio	1 día	vie 20/11/26	vie 20/11/26	28CC
31		0%		Aserrado de juntas	1 día	vie 18/12/26	vie 18/12/26	28
32		0%		Tomado de juntas	1 día	vie 1/1/27	vie 1/1/27	28FC+10 días
33		0%		Periodo de curado Etapa 1 parte B	20 días	vie 18/12/26	jue 14/1/27	28


'26 J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
