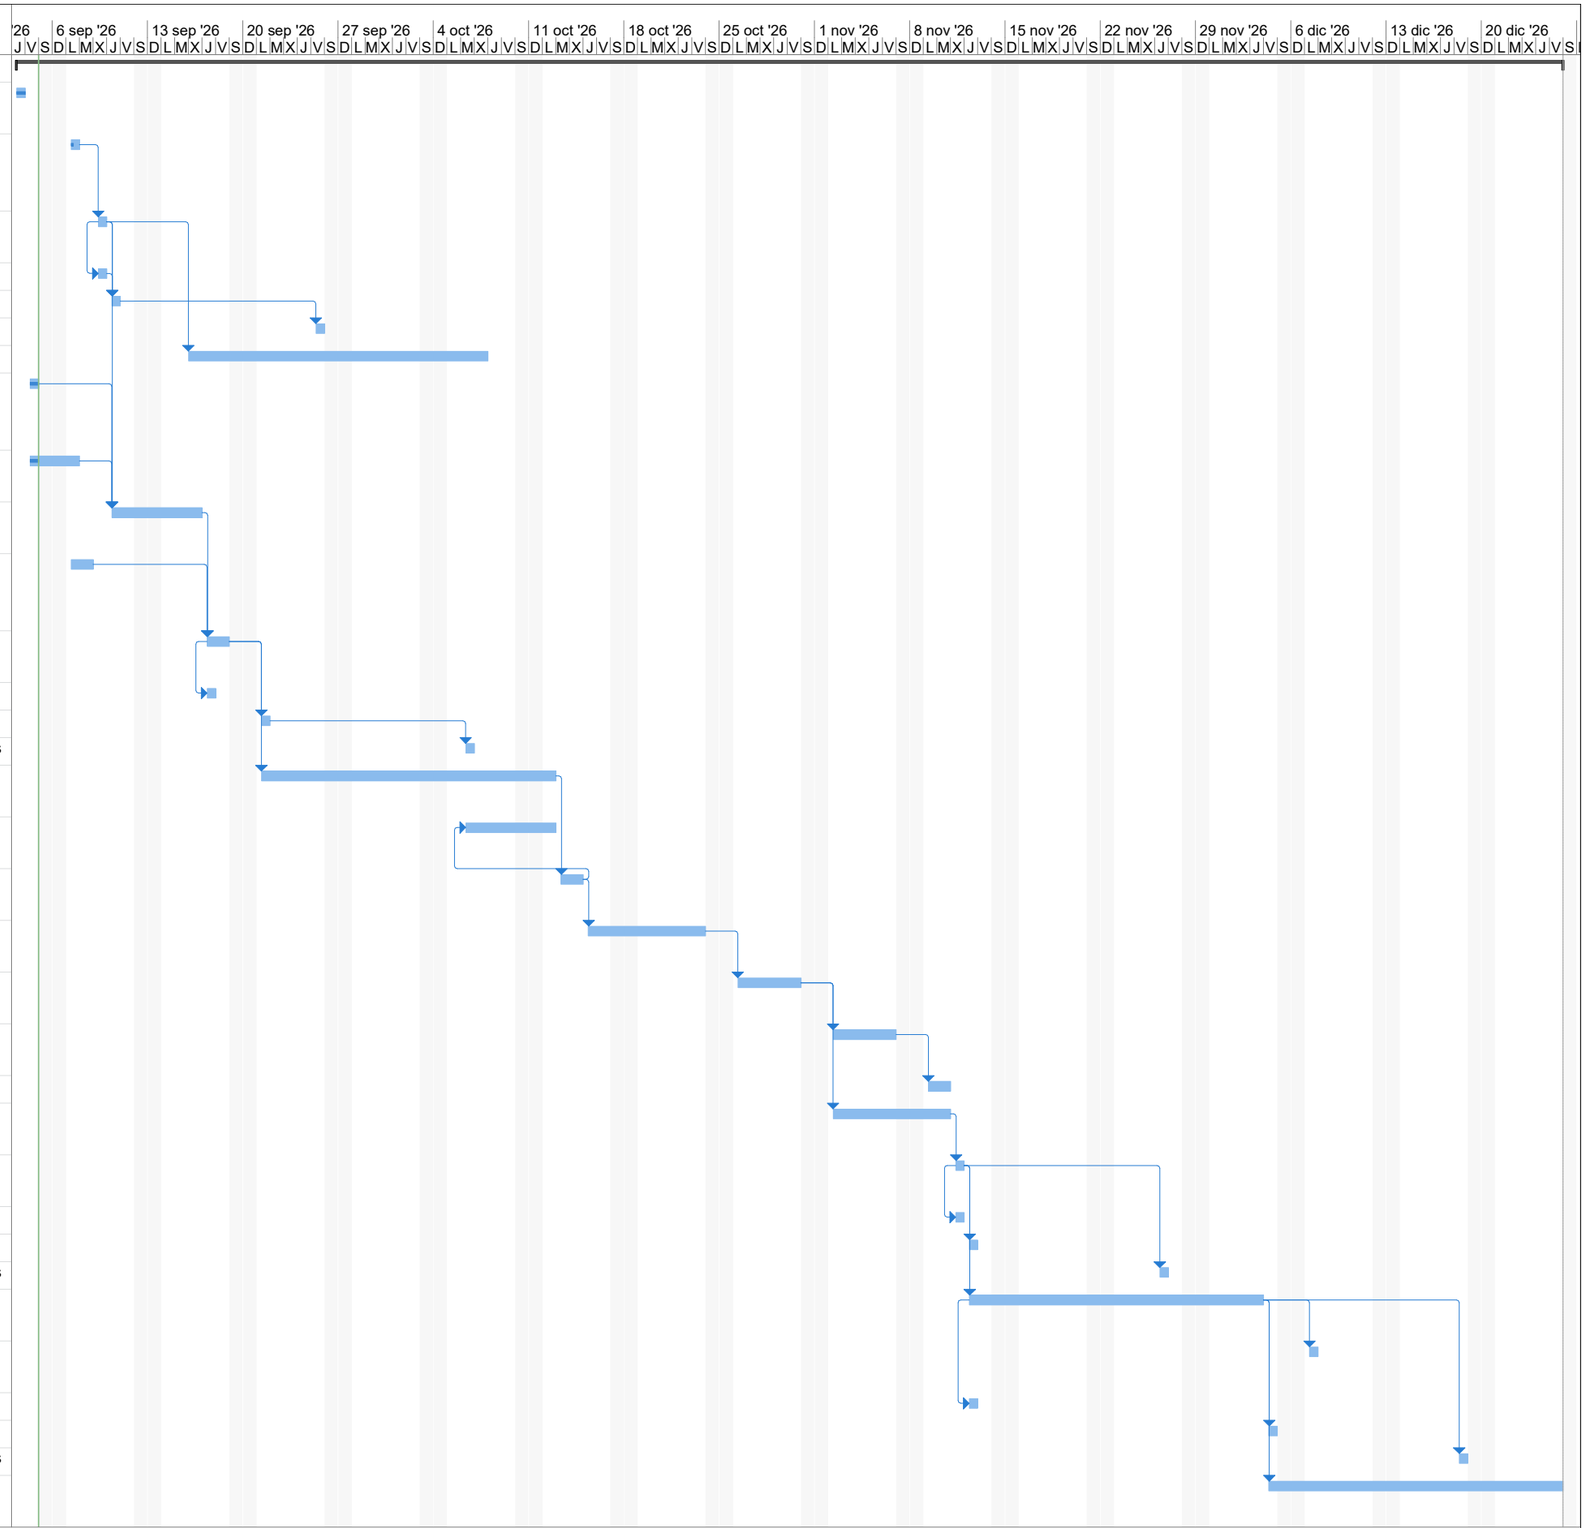
Id		% completa	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**3%**		**Pavimentos Pilar- Bimbo**	**82 días**	**jue 3/9/26**	**vie 25/12/26**	
2	✓	100%		Entrega de estudios Proctor y densidades	1 día	jue 3/9/26	jue 3/9/26	
3		50%		Colocación de nylon y limpieza pre hormigonado paño 1 (cerca de guardia)	1 día	lun 7/9/26	lun 7/9/26	
4		0%		Hormigonado paño 1(cerca de guardia) y cámara	1 día	mié 9/9/26	mié 9/9/26	3
5		0%		Laboratorio	1 día	mié 9/9/26	mié 9/9/26	4CC
6		0%		Aserrado de juntas	1 día	jue 10/9/26	jue 10/9/26	5;4
7		0%		Tomado de juntas	1 día	vie 25/9/26	vie 25/9/26	6FC+10 días
8		0%		Periodo de curado	16 días	mar 15/9/26	mié 7/10/26	4
9	✓	100%		Hormigonado diferencia de nivel en paño de pase de media tensión	1 día	vie 4/9/26	vie 4/9/26	
10		40%		Aprobar badenes para etapa 1 parte B	2 días	vie 4/9/26	lun 7/9/26	
11		0%		Ajuste de niveles, armado de badenes	5 días	jue 10/9/26	mié 16/9/26	9;10;4
12		0%		Pasadores en paños para hormigonado etapa 1 parte B	2 días	lun 7/9/26	mar 8/9/26	
13		0%		Hormigonado etapa 1 parte B	2 días	jue 17/9/26	vie 18/9/26	12;11
14		0%		Laboratorio	1 día	jue 17/9/26	jue 17/9/26	13CC
15		0%		Aserrado de juntas	1 día	lun 21/9/26	lun 21/9/26	13
16		0%		Tomado de juntas	1 día	mar 6/10/26	mar 6/10/26	15FC+10 días
17		0%		Periodo de curado Etapa 1 parte b	16 días	lun 21/9/26	lun 12/10/26	13
18		0%		Rotura y suelo cemento Etapa 2 curva despacho	5 días	mar 6/10/26	lun 12/10/26	19FC-7 días
19		0%		Rotura de pavimento Etapa 2	2 días	mar 13/10/26	mié 14/10/26	17
20		0%		Retiro de escombros y tosca	7 días	jue 15/10/26	vie 23/10/26	19
21		0%		Aporte de tosca -suelo cemento	5 días	lun 26/10/26	vie 30/10/26	20
22		0%		Toma muestras y estudio de suelo	5 días	lun 2/11/26	vie 6/11/26	21
23		0%		Ok Pruebas	2 días	lun 9/11/26	mar 10/11/26	22
24		0%		Colocación de armadura y encofrado	7 días	lun 2/11/26	mar 10/11/26	21
25		0%		Hormigonado Etapa 2 parte A	1 día	mié 11/11/26	mié 11/11/26	24
26		0%		Laboratorio	1 día	mié 11/11/26	mié 11/11/26	25CC
27		0%		Aserrado de juntas	1 día	jue 12/11/26	jue 12/11/26	25
28		0%		Tomado de juntas	1 día	jue 26/11/26	jue 26/11/26	25FC+10 días
29		0%		Periodo de curado Etapa 2 parte A	16 días	jue 12/11/26	jue 3/12/26	25
30		0%		Hormigonado Etapa 2 parte B	1 día	lun 7/12/26	lun 7/12/26	29FC+1 día
31		0%		Laboratorio	1 día	jue 12/11/26	jue 12/11/26	29CC
32		0%		Aserrado de juntas	1 día	vie 4/12/26	vie 4/12/26	29
33		0%		Tomado de juntas	1 día	vie 18/12/26	vie 18/12/26	29FC+10 días
34		0%		Periodo de curado Etapa 1 parte B	16 días	vie 4/12/26	vie 25/12/26	29


26 J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
