
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1		**Pavimentos Pilar-Bimbo**	**90 días?**	**lun 6/7/26**	**vie 6/11/26**		
2		Alta personal en sistema	10 días	lun 6/7/26	vie 17/7/26		
3		Medidas replanteo	1 día?	lun 6/7/26	lun 6/7/26		
4		Compra Hormigón	1 día?	lun 6/7/26	lun 6/7/26		
5		Compra moldes	1 día?	lun 6/7/26	lun 6/7/26		
6		Compra malla naranj	1 día?	lun 6/7/26	lun 6/7/26		
7		Corte de pasadores	4 días	lun 6/7/26	jue 9/7/26		2 Personas
8		Contrato empresa mov suelos	1 día?	lun 6/7/26	lun 6/7/26		
9		Estudio a la tosca a aportar	5 días	lun 6/7/26	vie 10/7/26		Ing contratado
10		Vallado del sector	1 día	lun 6/7/26	lun 6/7/26		2 Personas
11		Aserrado de juntas	2 días	lun 6/7/26	mar 7/7/26		2 Personas
12		Rotura de pavimento	2 días	mié 8/7/26	jue 9/7/26	11	Delta
13		Retiro de escombros y tosca	3 días	vie 10/7/26	mar 14/7/26	12	Delta
14		Aporte de tosca -suelo cemento	2 días	mié 15/7/26	jue 16/7/26	13	Delta
15		Toma muestras y estudio de suelo	5 días	vie 17/7/26	jue 23/7/26	14	Ing contratado
16		Ok Pruebas	1 día?	vie 24/7/26	vie 24/7/26	15	
17		Colocación nylon	1 día?	lun 27/7/26	lun 27/7/26	16	
18		Colocación de pasadores y	1 día?	mar 28/7/26	mar 28/7/26	17	
19		Hormigonado etapa	1 día?	mié 29/7/26	mié 29/7/26	18	
20		Antisol	1 día?	jue 30/7/26	jue 30/7/26	19	
21		Curado	28 días	vie 31/7/26	mar 8/9/26	20	
22		Vallado del sector	1 día	mié 9/9/26	mié 9/9/26	21	2 Personas
23		Aserrado de juntas	2 días	jue 10/9/26	vie 11/9/26	22	2 Personas
24		Rotura de pavimento	2 días	lun 14/9/26	mar 15/9/26	23	Delta
25		Retiro de escombros y tosca	3 días	mié 16/9/26	vie 18/9/26	24	Delta
26		Aporte de tosca -suelo cemento	2 días	lun 21/9/26	mar 22/9/26	25	Delta
27		Toma muestras y estudio de suelo	5 días	mié 23/9/26	mar 29/9/26	26	Ing contratado
28		Ok Pruebas	1 día?	mié 23/9/26	mié 23/9/26	26	
29		Colocación nylon	1 día?	jue 24/9/26	jue 24/9/26	28	
30		Colocación de pasadores y	1 día?	vie 25/9/26	vie 25/9/26	29	
31		Hormigonado etapa	1 día?	lun 28/9/26	lun 28/9/26	30	
32		Antisol	1 día?	mar 29/9/26	mar 29/9/26	31	
33		Curado	28 días	mié 30/9/26	vie 6/11/26	32	

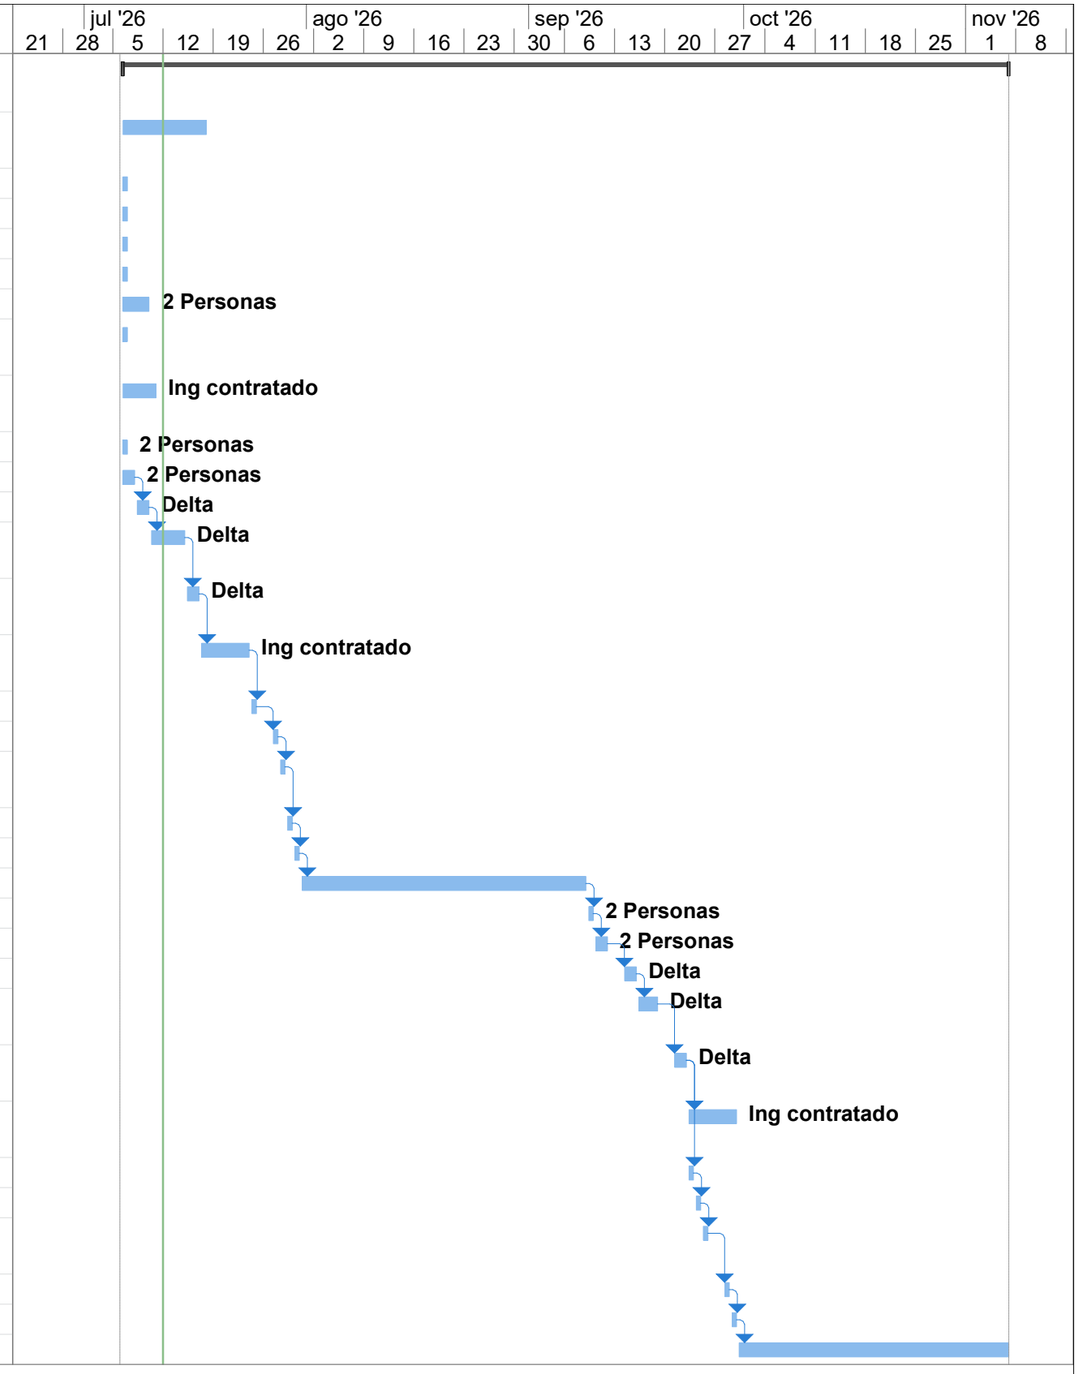

Proyecto: msproj11
Fecha: dom 12/7/26

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			
